

תכנון מרחב מרכז

סיכום 2018 - ביחס לתכנית עבודה והיערכות ל- 2019



ינואר 2019

תמונה מסיום ביצוע שיקום חניון מח"ל –אזור ההר.
תכנון: מחלקת תכנון , בשיתוף עם האזור, ביצוע קבלן מסגרת

תוכניות סטטוטוריות בקידום קק"ל 2018

שם תוכנית	אזור	תכנון 2018	ביצוע 2018	חסמים / הערות
מרכז קק"ל בית נחמיה	חוף שפלה	אישור תכנית	 הוגשו מסמכים סופיים לאישור הועדה	יש להתחיל בתכנון המפורט של המתחם להוצאת היתרי בניה – באחריות מחלקת בינוי, אגף בינוי ותחזוקה.
יער מודיעין	חוף שפלה	ועדת היגוי		בוצעו תיאומים, התכנית בתיקונים והכנה להגשה למוסדות התכנון
יער ראש העין	חוף+ מנשה	התקשרות		בחירת מתכנן ב 1Q 2019
יער השלום	ההר	ע"פ החלטת מנהל מפ"ק		התעכב בגלל הבחירות המוניציפליות
יער רמות	ההר	באחריות אגף / הנהלה		מטופל על ידי אגף התכנון והלשכה המשפטית: הוגשה עתירה כנגד אי שיבוץ התכנית לדיון מוצע לדון עם ראש העיר הנבחר
יער קדימה	מנשה שרון	אישור תכנית		תכנית אושרה ב 2018
בתות תנינים רז	מנשה שרון	אישור תכנית		רט"ג מובילה את התכנית לקראת אישור


סיכום – סטטוטוריקה - שומף

סטטוס	הערות	פירוט הפרויקטים	ביצוע 2018	תכנון 2018	סוג הפרויקט
תלוי החלטות הנהלה	אשתאול ובית נחמיה בשיתוף הימנותא	אשתאול, גבעת ישעיהו, בית נחמיה, יקנעם	קידום	קידום	הסדרה סטטוטורית מרכזי עבודה
		פארק הקופים, שוני, אילנות	קידום	קידום	הסדרה סטטוטורית מוקדי שרות
		כ-200 תכניות כ-100 תכניות נוספות עברו את תהליך הבדיקה ונמצאו שאינן פוגעות במקרקעי יעור		שוטף	ליווי, מעקב ובקרת תכניות גורמי חוץ הפוגעות במקרקעי ייעור
הדבר לא נדרש כיום ויחייב היערכות של כח אדם		כ-20 תכניות בתחום המרחב לאחר אישור הועדות המקומיות יקבלו סמכות שתחייב נציגות קק"ל בועדות המקומיות		שוטף	ליווי תכניות כוללניות
		כ-40 תכניות בשנה- שלבי סטטוטוריקה ותכנון מפורט		שוטף	ליווי תכנון תשתיות
	צפי לגידול משמעותי	השנה התקבלו 9 בקשות למידע		שוטף	רישוי זמין
		ייצוג קק"ל במוסדות התכנון ובחינת תכניות פוגעות ביערות ופנים ארגוניות והוצאת חוות דעת	4 חודשים	12 חודשים	קליטת יועצת חיצונית


סיכום סטטוטוריקה - פורמט קק"ל

הערות	חסמים	סיכום שנתי לביצוע מול תכנון המשימה	סה"כ תכנון שנתי	ביצוע Q4	ביצוע Q3	התקדמות חצי שנתית בביצוע המשימה	ביצוע Q2	ביצוע Q1	תיאור תפוקה/ הישג נדרש
95% מהתכנון בוצע: יער קדימה-קיבלה תוקף; בית נחמיה - נוסף דיון בולקחש"פ, מסמכים הועברו לוועדה למתן תוקף; יער קהילתי רמות - בטיפול אגף התכנון מול מוסדות התכנון	תלות בגורמים חיצוניים לקק"ל	בוצעה חלקית ומועברת ל- 2019	קידום תכניות מפורטות ליערות ומרכזי העבודה הבאים: קדימה, בית נחמיה, מודיעין, בתות תנינים רז, יער קהילתי רמות	בוצעה חלקית	בוצעה	מתקדמת כמתוכנן	בוצעה	בוצעה	אישור תכניות יער מפורטות
95% בוצע. ברבעון הראשון לא היה תכנון. הוצאת ההתקשרות התעכבה בשל ועדת המכרזים	משפטי/מכרזים	בוצעה חלקית ומועברת ל- 2019	הנעת תכנית מפורטת ליער ראש העין, (נס הרים ויקנעם לא ניתן לקבוע לוחות זמנים עד לקבלת החלטות)	בוצעה חלקית	בוצעה	מתקדמת כמתוכנן	בוצעה	לא בוצעה	אישור תכניות יער מפורטות

סקרי טבע נוף ומורשת

סוג הפרויקט	תכנון	ביצוע	פירוט הפרויקטים	עצמי/חיצוני	סטטוס
סקרים	4	6 	סקר יער בן שמן (המשך מ 2017) סקר יער גבעת עדה (המשך מ 2017) סקר יעל גדרות – בית גמליאל סקר נחל שילה – נטיעות דרום ראש העין סקר אקוהדרולוגיה יער חדרה סקר ואדי ערה – מזרח עירון	חיצוני: מכון דש"א עוזי שמיר אורי מורן	בוצע

יער בן שמן | סקר ערכי טבע ונוף 2018



מרכז הסקר: עוזי שמיר
באספיקה ואספיקה: אבנר רומת
כתובה ועריכה: עוזי שמיר

מזרח עירון


פאוס אל-חמס אל פאתי עמק יזרעאל

סקר, ניהול והתייבה של טבע, 05 וולונטרים וחברים
ד"רית סיסמן



נעלמת סביבסוף וארץ רמון, תשרי 2018 – ספטמבר 2018


גבעות הבתה מדרום לעיר ראש העין –
סקר אקולוגי. ביער כח מטעם הקרן הקיימת לישראל
אביב 2018



מרכז הסקר: עוזי שמיר
באספיקה ואספיקה: אבנר רומת
כתובה ועריכה: עוזי שמיר

יער בית גמליאל


סקר ערכי טבע ומפגעים



הילה גול, דר בן נתן, עידן טלמון ואמיר פרלברג
יולי 2018 • תמוז תשע"ח


סקר אקוהדרולוגי יער חדרה

דו"ח מצב קיים



מוגש לקרן קיימת לישראל – מרחב מרכז
עייני מורן יועץ ופיתוח

עדכון: יולי 2018



סקר יער אלות עדה



מרב לבל, מיני חן, רעות לוריא, סב שדה, ד"ר אמיר פרלברג, אורי רמון
אוגוסט 2018, אב התשע"ח



תכניות אב - יערות

שם תכנית	אזור	תכנון 2018	ביצוע 2018	חסמים / הערות
מרכז שדה - פארק שוני V	מנשה השרון	סיום	הסתיים	קידום בשיתוף אגף התכנון ואגף החינוך. עיכוב בהתקשרויות עם יועצים נדרש דיון הנהלה, תכנון חיצוני
יער חדרה V	מנשה השרון	סיום	קרוב לסיום	תוכנית אב תכנון עצמי - המשך תכנון חיצוני. תכנית רעיונית לקראת סיום
יערות ואדי ערה V V	מנשה השרון	הוצאת התקשרות	זוכה יובא לאישור ועדה בסוף ינואר	יצא לתכנון חיצוני ברבעון Q4
יער בן שמן V	החוף	סיום	הסתיים	תכנון חיצוני (איריס ברנשטיין) ומחלקת תכנון
יער ראש העין V	החוף	סיום	הסתיים	תכנון עצמי - תחילת תכנון מפורט - תלוי זמן וכסף יער קהילתי
יער חולדה V	החוף	סיום	הסתיים	יש מנהל תכנון חיצוני
יער ירושלים V	ההר	דחייה ל 2019	יושלם ב 2019	תכנון עצמי יער קהילתי

תכניות אב




מתווה תוכנית האב וחלוקה למתחמים



- מתחם לשימור שיקום ונטיעה
- אזור טיילות מבוקר - רגל ואופנים
- אזור לשימור וגן ארכאולוגי
- אזור פיתוח אינטנסיבי לסנאי ונופש
- מתחם המבואה ליער
- טיילת הליכה בריאותית
- טיילת הנחל
- שביל הפרחות
- שביל משפחות-רגל ואופנים
- דרך יער לרכב וחניה
- מבואה ליער- ראשית/ משנית

יער ראש העין

יער בן שמן

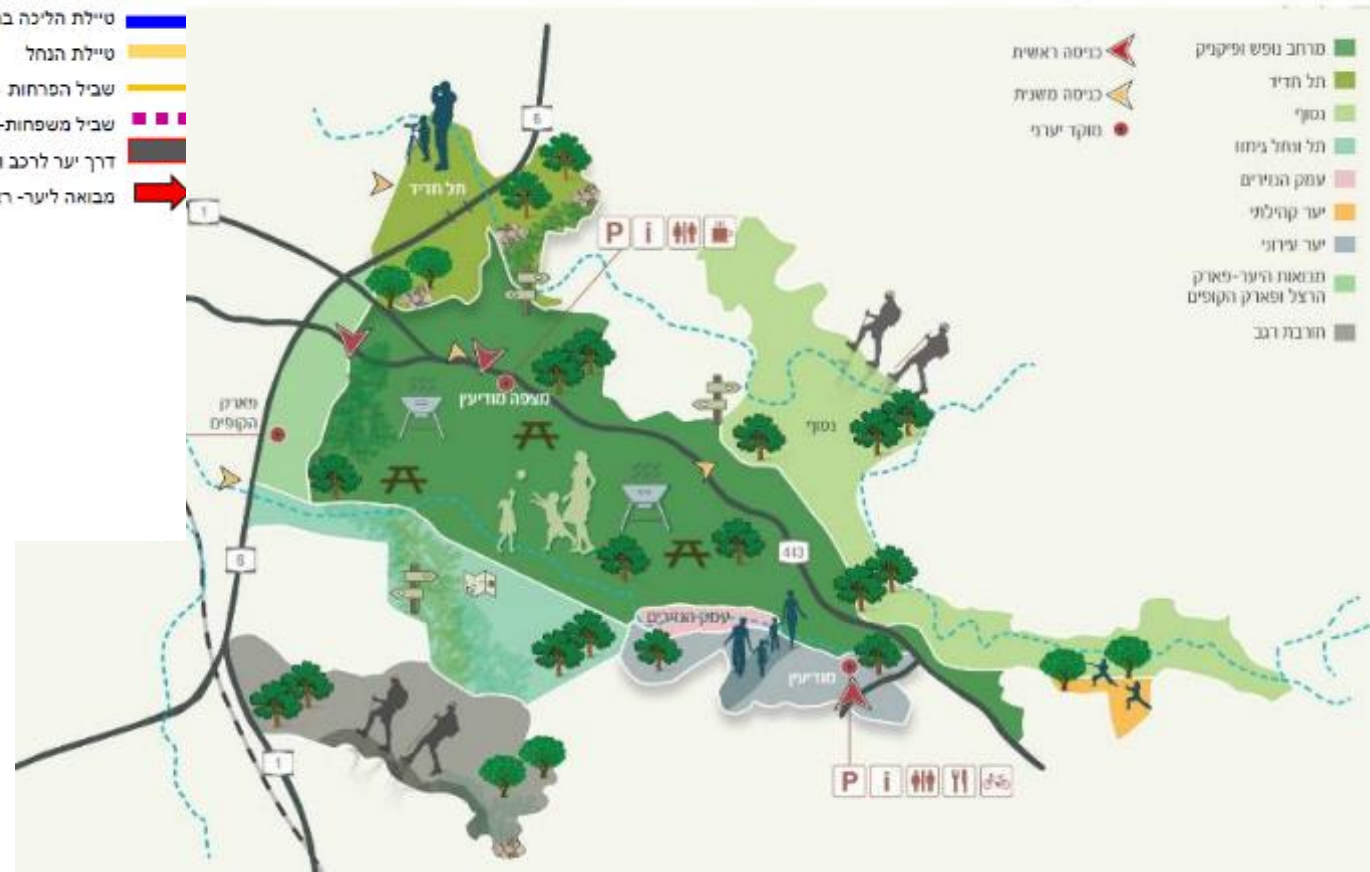

- מרחב נפש ופיקניק
- תל חדיד
- נסקי
- תל וחתל גיטות
- עמק הנונים
- יער קהילתי
- יער יערי
- תחנת היער-פארק
- הרצל ופארק הקופים
- חורבת רב



עקרונות התכנון

- **קהל היעד** - יער חדרה ממוקם בין חדרה לבעת-אולגה ובין כביש החוף לכביש 4, מיקום זה מאפשר לו להיות נגיש ומזמין לאוכלוסיות רבות ומגוונות מהסביבה הקרובה והרחוקה.
- **שימושי היער** - השימושים הרגילים ונרחבים מענה לקשת רחבה של אוכלוסיות וגילאים - יער עירוני עם מתקני משחק וגזרת קהילתיות, מסלולי טיול וספורט, יער מאכל, צפייה בבעלי-חיים ובבריכות אקולוגיות בטבע ואזורי פיקניק ולינה.
- **שימור החי והצומח הקיים וחיידוש בתי הגידול** - הוקדשה תשומה לב רבה לכלל אורות החיים הקיימות יחד עם יצירת בתי גידול לאזרחים חיים חדשות. תוכננו מסדרונות אקולוגיים, שטחי רעייה לעדרי הבקר הקיימים, גדרות מרעה לעדרים חדשים ובריכות חורף לבעלי-חיים ימיים.
- **לימוד ויישום של טיפול ושמירה על הטבע** - בנוסף למגוון הפעילויות תוכננו פונקציות אשר מטרתן היא טיפול ושמירה על הטבע, הבאים לפארק מוזמנים להיות חלק וללמוד על נושא זה ביער המאכל וחלקות הגידול ובביו-פילטרים אשר מטפלים במים הנכנסים מהערד אל היער.


את מגוון השימושים השונים עוטף היער הווריקי ויחד עם גוף המים המרכזי יוצר מיקור אקלים ייחודי בארצנו.

חמיקום חנוה, חמרחבים, חמאקלים וחמגוון הגדול של חמשימושים חופכים את היער למקום בילוי אטרקטיבי בכל ימות השנה.




תכניות אב וממשק יערוני – תכנית רב שנתית

שם תוכנית	אזור	יערות	צפי סיום	חסמים / הערות
תכנית אב וממשק בן שמן	החוף	בן שמן	Q4 2019	בתהליך
תכנית אב וממשק נוספת	החוף	ציר הגבעות / פארק בריטניה	2021	
תכנית אב וממשק צפ' הרי ירושלים	ההר	"הדרך אל העיר": כפירה, נווה אילן, מעלה החמישה	2018	לקראת השלמה
תוכנית אב וממשק אגן נחל רפאים	ההר	פארק בגין, יער עמינדב	Q3 2019	בתחילת התהליך
תכנית אב וממשק פארק עצמאות ארה"ב	ההר	פארק עצמאות ארה"ב	2020	תתחיל ב- 2019 אחרונה בא. ההר
תכנית אב וממשק ואדי ערה	מנש"ר	גוש עירון	2020	תתחיל ב 2019 אחרי תכנית אב

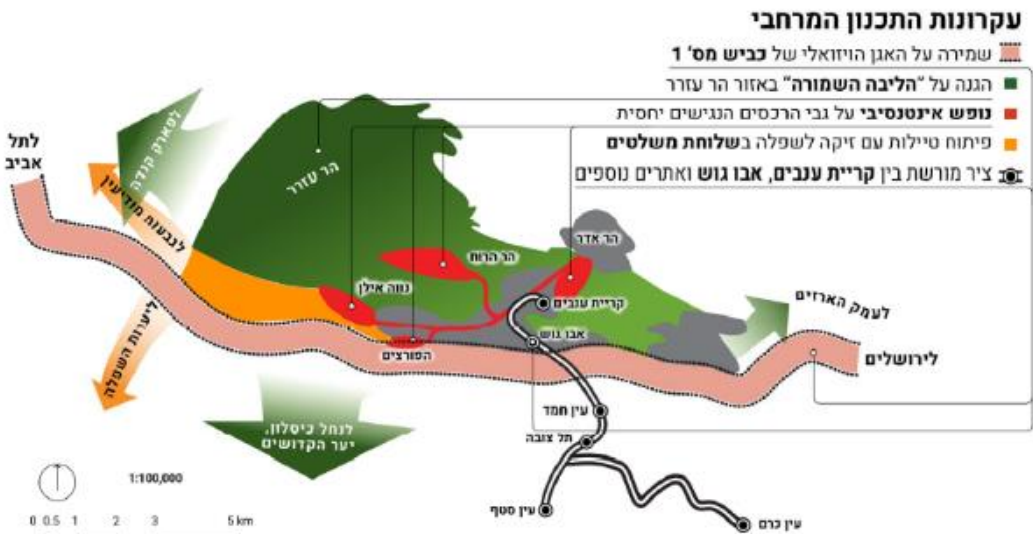

תוכנית אב וממשק - צפון הרי ירושלים תכנון: שגיא אלוני


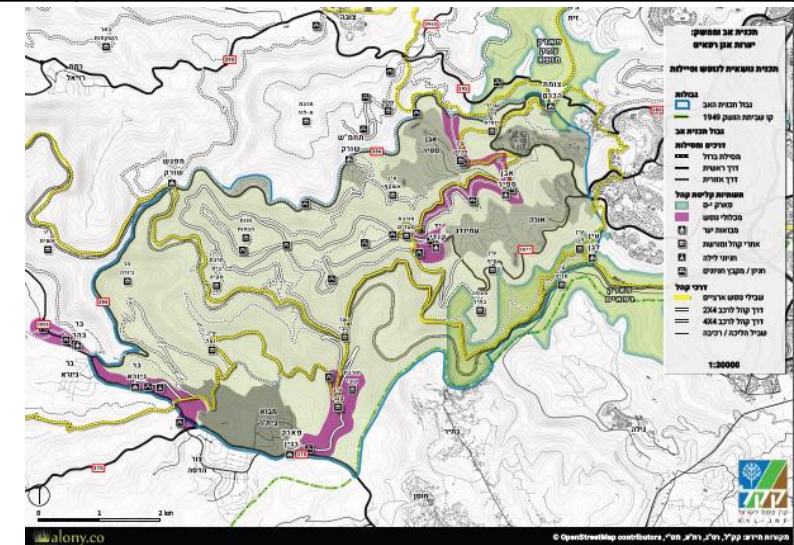


תוכנית אב- אגן רפאים. תכנון: שגיא אלוני,

סיכום שנתי תכניות אב - פורמט קק"ל


הערות	חסמים	סיכום שנתי לביצוע מול תכנון המשימה	סה"כ תכנון שנתי	ביצוע Q4	ביצוע Q3	התקדמות חצי שנתית בביצוע המשימה	ביצוע Q2	ביצוע Q1	תיאור תפוקה/ הישג נדרש
בן שמן ראש העין וחולדה קודמו כמתוכנן. קידום יער ירושלים נדחה לשנה הבאה בשל נושא היער הקהילתי המתוכנן בו, נדרשנו לתכניות אד הוק ליערות קדימה אילנות בשל איומים סטטוטורים ולכן פארק קנדה נדחה	פערי כוח אדם ומשאבים	הושלמה על פי תכנון	קידום תכניות אב ליערות ופארקים בניהול קק"ל: בן שמן, ראש העין, פארק קנדה, יער ירושלים, יער חולדה	בוצע	בוצעה	מתקדמת כמתוכנן	בוצעה	בוצעה	קידום 5 תכניות אב ליערות

סיכום - פרויקטים- תכנון רעיוני ומפורט

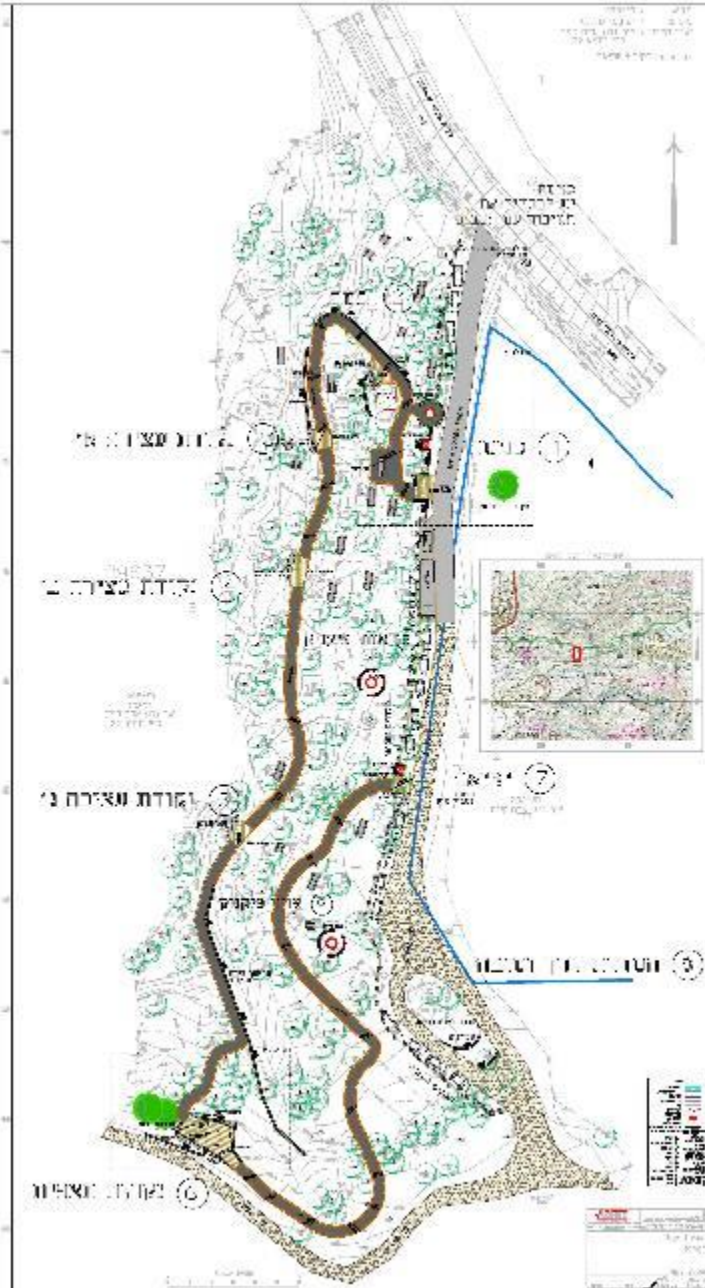


כניסה לאגן
חנינון יצחק בקקאש

תוכנית מבואה מערבית - יער הקדושים

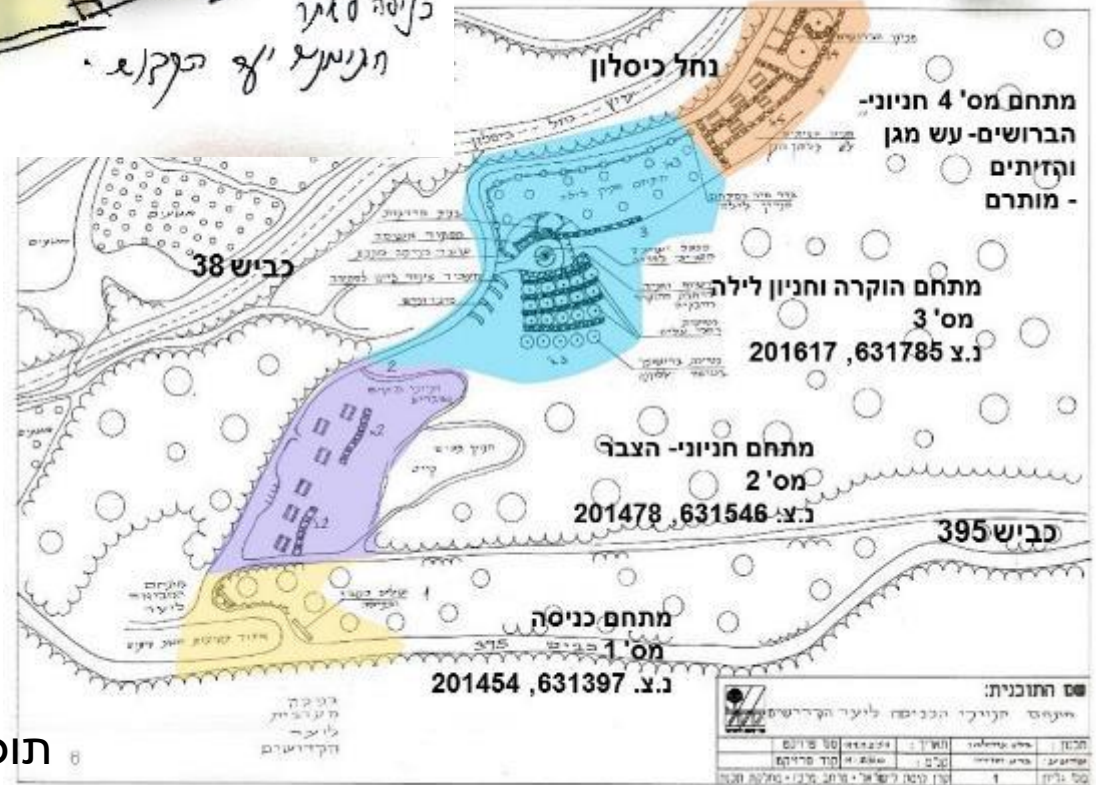

תוכנית יער יהדות תימן - יער הקדושים

פרויקטים – תכנון מפורט לשבילים

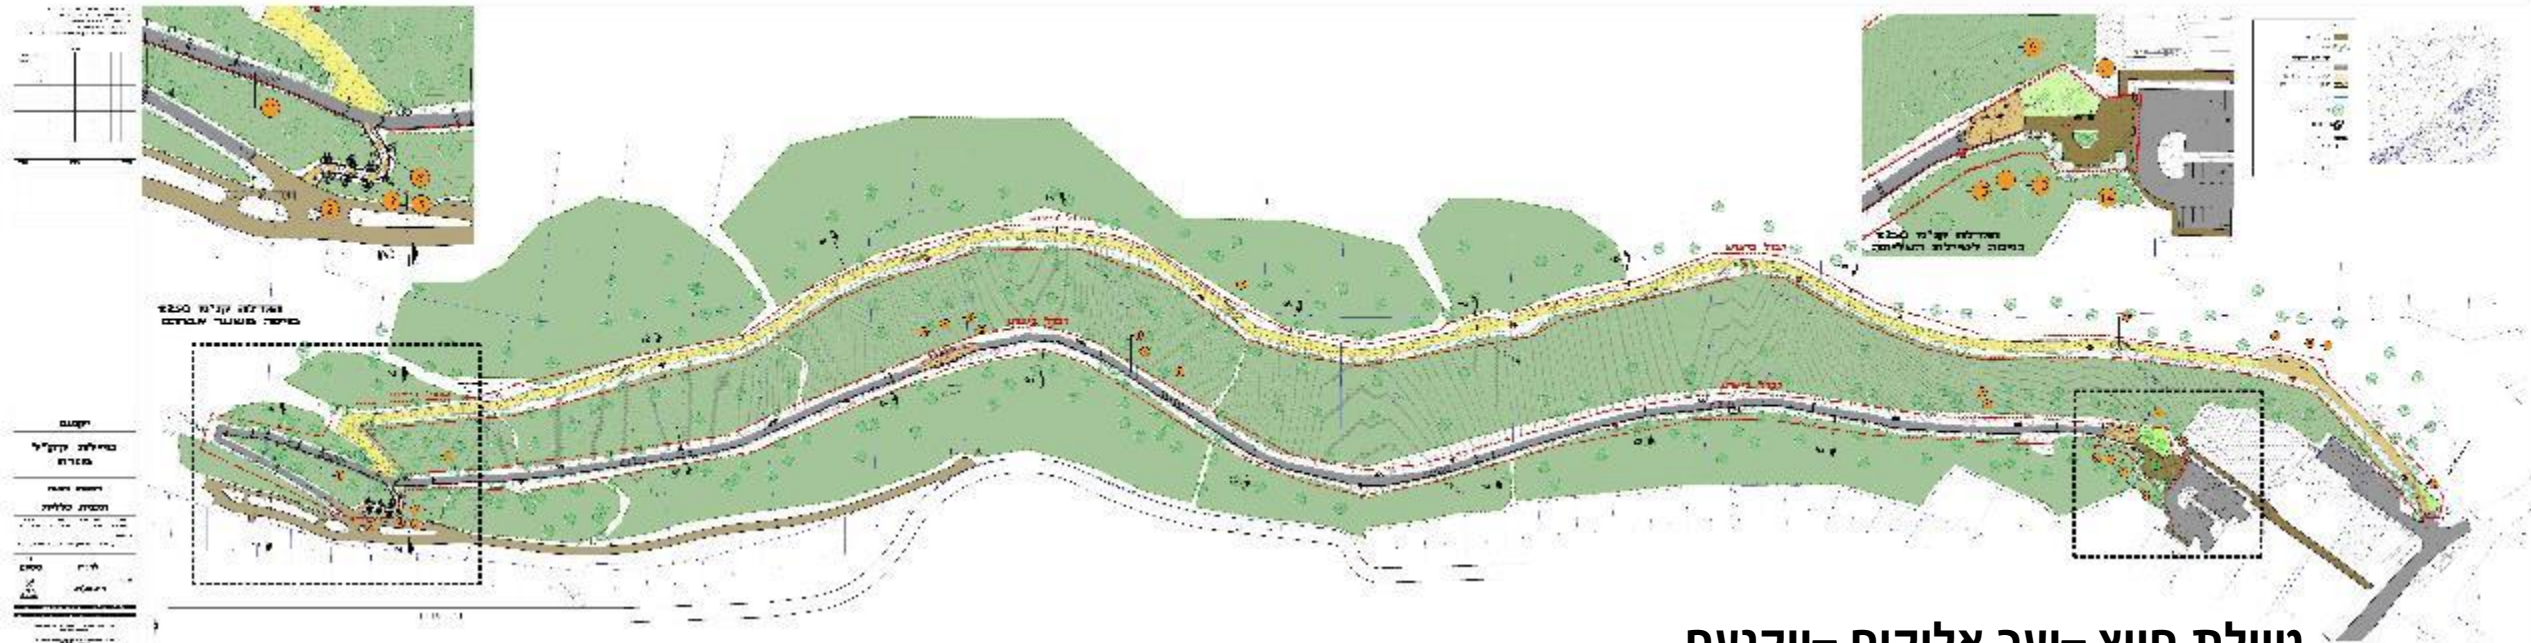

טיילת חייץ – יער אליקים – יוקנעם



תמונות מצב
קיים טיילת
מזרחית- שלב א'



פרויקטים – תכנון מרכזי הוקרה ושבילים

הערות	תכנון עצמי/חיצוני	פירוט הפרויקטים	תכנון בפועל	ת.עבודה 2018	סוג הפרויקט
	2 תכנון חוץ 4 תכנון עצמי	BT 1. מרכז הוקרה ארגנטינה (ניסמן) – בן שמן B 2. מרכז הוקרה אשתאול עליון-אזור החוף B 3. מרכז הוקרה אונטריו- יער ירושלים – אזור ההר B 4. מרכז הוקרה- בית נחמיה B 5. מרכז הוקרה פארק בריטניה 6. מרכז הוקרה הר אדר	תוכנו – 4 ביצוע – 4 (מהם 2 תוכנו בשנים קודמות)	תכנון 4 מרכזי הוקרה ביצוע - שוטף	מרכזי הוקרה
	2 תכנון חוץ 7 תכנון עצמי	BT 1. שביל אמאוס + ביצוע חלקי 2. שביל החסידות - פרוגרמה 3. שביל הגיתות – שעלבים B 4. שביל יער ראש העין 5. שביל טיילת יער אליקים 6. שביל קרית ענבים B 7. שביל נחל מיסקא + ביצוע T 8. שביל נחל השופט – שדרוג חלק עליון – תכנון עצמי 9. שביל נחל השופט – שדרוג חלק תחתון – תכנון חוץ	תוכנו 9 ביצוע 2	תכנון כחלק מפרויקטים ביערות	שבילים ביערות

סיכום פרויקטים שבוצעו ב 2018

הערות	תכנון עצמי/חיצוני	פירוט הפרויקטים	ביצוע בפועל	ת.עבודה 2018	סוג הפרויקט
	חיצוני - 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. חניון מח"ל – יער הקדושים - אזור ההר 2. חניון עופר קנריק – יער ירושלים 3. מרכז הוקרה אונטריו- יער ירושלים – אזור ההר 4. חניון בני ציון – יער ירושלים – אזור ההר 5. חניון מרכז הוקרה- ארגנטינה – בן שמן אזור החוף 6. מרכז הוקרה אשתאול עליון-אזור החוף 7. הנגשת מצפה מודיעין 8. חניון ברכה- יער חרובית 9. מרכז הוקרה- בית נחמיה 10. חניון טל יפרח – רמות מנשה 11. מבואת האלה – גבעת עדה 12. הנגשת אגם - פארק קנדה 13. חניון פולג – בית יהושוע 14. נחל מיסקה – ואדי ערה 15. שביל אמאוס – רק אזור ההר 16. ביוב יד קנדי 	16	שוטף	פרויקטים שבוצעו ביערות



תכנון חיצוני
תכנון פנימי

קו ביוב יד קנדי

חניון בני ציון- יער ירושלים

נגישות



סיום מחויבות לנציבות
דוגמאות לפרויקטים נגישים
שתוכננו והסתיימו



הנגשת מצפה מודיעין –
יער בן שמן

הנגשת חורבת תנשמת – ער שוהם

הנגשת האגם – פארק קנדה



סיכום ביצוע – פרויקט לדוגמא אזור ההר



סיום ביצוע- חניון מחל יער הקדושים
תכנון וניהול: בלה נודלמן, טליה בקר, חיים סהר,
גידי בשן, ג'מאל דוויאת, חנוך צורף

סיכום – פרויקט לדוגמא אזור החוף



סיום ביצוע- מרכז הוקרה – ארגנטינה ניסמן- בן שמן
תכנון: גלית גולני, חיים סהר, בלה נודלמן, טליה בקר

סיכום – פרויקט לדוגמא אזור מנשה השרון



סיום ביצוע- חניון לזכרו של טל יפרח – פארק רמות מנשה
תכנון: בלה נודלמן ליווי: טליה בקר

שבילים ביערות

שביל אמאוס



שביל קרית ענבים

תכנון שביל קרית ענבים כ-2400 מטר

יער החמישה (גן לאומי הרי יהודה)

להראדה
שלט מבואה
בית קברות
בשרונות
מלון כרמים
קרית ענבים
מרכז מסחרי
חניה
תחנת דלק
סילון
מזבח
בונקרים
10 מדרגות
בית נקטפה

ספסל לנוף
כרם
יער החמישה

למחלקת חמד

נקרא	שלו מסאג	שלו מסבר	סוג שביל	דרך עפר קומה	שב לאספלט	שב לזעזע	שביל זעזע או מדרגות
	⊙	⊙	⚠	—	—	—	—

Document Name: קרית ענבים Date: 07/11/2018 1:3,300 מטר 100



סיכום – שימור נגר ודרכים

סטטוס	תכנון עצמי/חיצוני	פירוט הפרויקטים	ביצוע בפועל	כמות ת.עבודה	סוג הפרויקט
	1 עצמי - 2	דרך יער ראשית פארק רמות מנשה – אנדרטת הקיבוצים דרך יער –ראש העין	2	2	דרכים ביערות
		בריכת יער בטיח נחל זוהרה בפארק רמות מנשה			שימור נגר



סיכרונים לשימור נגר- חניון אלברטו ניסמן ארגנטינה



בריכת בטיח

תכניות בינוי - סיכום פורמט קק"ל


הערות	חסמים	סיכום שנתי לביצוע מול תכנון המשימה	סה"כ תכנון שנתי	ביצוע Q4	ביצוע Q3	התקדמות חצי שנתית בביצוע המשימה	ביצוע Q2	ביצוע Q1	תיאור תפוקה/ הישג נדרש
בית הרצל הושלם כמתוכנן. סטף ויד קנדי התעכבו בשל מנהל הפרויקט החיצוני	תלות בגורמים חיצוניים לקק"ל	בוצעה חלקית ומועברת ל- 2019	קידום פרוגרמה ותכנית אב לבית הרצל היתר בניה ותיק מכרז לסטף תיק מרכז ופרסום מכרז ליד קנדי	בוצעה חלקית	בוצעה	מתקדמת כמתוכנן	בוצעה	בוצעה	הקמת מוקדי שרות יערניים במרחב ותפעולם

בית הרצל

מוקד סטף



האתר | תכנית מוצעת חלופה 1

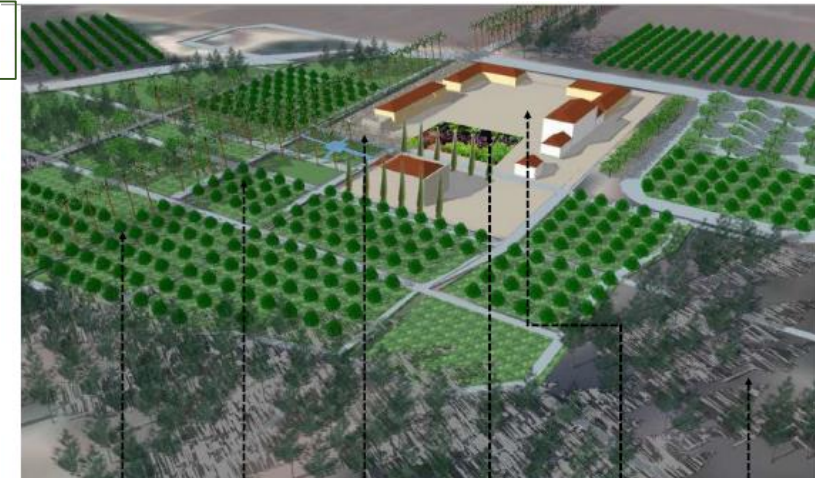

יער מאכל חלקות מסע גן מים גן ירק חצר החווה יער קיים

תכניות אב נושאיות ומסמכי מדיניות - ארצי

שם תוכנית	אזור	יערות	צפי סיום	חסמים / הערות
תוכנית אב ארצית לאופנים	ארצי	כולם	2018	מובל ע"י אגף התכנון - התוכנית אושרה עי ההנהלה, במרחב- בלה
בריכות חורף במרחב	ארצי	כולם	2018	מובל ע"י אגף התכנון - במרחב עדי וחיים מוטמע בתכניות מרחביות
צפרות	ארצי	כולם	2018	מובל ע"י אגף התכנון - מוטמע בתכניות מרחביות
דרכי נוף / דרכי יער	ארצי	כולם	2019	מובל ע"י אגף התכנון - במרחב עדי וחיים
פרטים ליערות קהילתיים	ארצי	כולם	2018	מובל ע"י אגף התכנון - במרחב עדי. נבחרו 7 יערות במרחב כפיילוט ארצי

**תכניות שהסתיימו -
היערכות להמשך תכנון
במרחב**



**תוכנית אב
ארצית**

לשבילי אופניים
ביערות קק"ל



תכניות אופנים לתכנון מפורט

טבלת תוכנית תקציב אופנים- מרחב מרכז (עדכון 8-11-18)

שבילים מתוכננים / לביצוע

שנת תקציב	מרחב	אזור	שם שביל	סטטוס תכנון	עלות תכנון / לוויה	אורך	אומדן ביצוע	אומדן תחזוקה שנתית
2019	מרכז	משנה שרון	יערות מצר מענית	יש תוכנית	120 אש"ח	35	2.3 מיליון	50 אש"ח
2019	מרכז	החוף	יערות צרעה אשתאול	יש תוכנית	250 אש"ח	55	2.2 מיליון	80 אש"ח
2019	מרכז	ההר	עין רפא- השלמת השביל	יש תוכנית		15	100 אש"ח	25 אש"ח
2020	מרכז	מנשה שרון	יער חורשים	יש תוכנית	120 אש"ח	40	1.3 מיליון	60 אש"ח
2019-2020	מרכז	ההר + החוף	ארץ האופנים שפלה יהודה	הוצאת התקשרות לתוכנית	150 אש"ח- עלות תכנון רעיוני-מפורט	30	1 מיליון	50 אש"ח
2021	מרכז	מנשה שרון	כוכב יאיר	יש תוכנית	100 אש"ח	35	600 אש"ח	50 אש"ח
2021	מרכז	מנשה שרון	פארק אלונה	יש תוכנית	120 אש"ח	35	500 אש"ח	50 אש"ח

תחזוקה של שבילים קיימים - מרחב מרכז

2019	מרכז	מנשה שרון	יוקנעם-עין השופט- הזורע					
2019	מרכז	הר	6 שבילים					
2019	מרכז	חוף	11 שבילים בגושים בן שמן ומשואה					

תכנית רב שנתית מרחב מרכז



אזור	שם השביל	סטטוס
שנת תקציב 2019		
מנשה שרון	יערות מצר- מענית	ביצוע
החוף	יערות צרעה ואשתאול	ביצוע
ההר	עין רפא- השלמת השביל	ביצוע
מנשה שרון	יוקנעם- עין השופט- הזורע	תחזוקה
הר	6 שבילים	תחזוקה
חוף	11 שבילים בגושים בן שמן ומשואה	תחזוקה
שנת תקציב 2019-2020		
ההר+ החוף	ארץ האופניים- שפלה יהודה	תכנון
שנת תקציב 2021		
מנשה שרון	כוכב יאיר	ביצוע
מנשה שרון	פארק אלונה	ביצוע

חסמים 2018

התקשרויות	תהליך התקשרות עבור מתכננים ויועצים חיצוניים לקח בממוצע כחצי שנה.
פרויקטים ארגוניים המחייבים היערכות ייעודית	בעיקר הסדרת מרכזי שדה (נס הרים ושוני) ומרכזי עבודה (אשתאול, בית נחמיה, גבעת ישעיהו) <ul style="list-style-type: none">• מחייב תשומות ניהול תכנון גדולות, מנהלת המחלקה עושה זאת ע"ח השוטף ונושאים אחרים• מחייב הגדרת אחריות בין תכנון-הימנותא-בינוי• מחייב החלטות הנהלה• מחייב היערכות תקציבית
מחסור בתקציבי ביצוע	פרויקטים מוכנים מחכים זמן רב לתיקצוב, ומחייבים רה-תכנון כשכבר מגיעים
כח אדם	מחסור ברכז סטטוטורי לשוטף (יועצת חיצונית אושרה בדצמבר – 8 חודשים היינו בלי) נחיצות בעוד רכז סטטוטורי לוועדות מחסור ברכז פרויקטים פרישה צפויה של שרטטת המחלקה

יתרונות 2018

קדימות לפרויקטים ארגוניים בגיבוי מנהל המרחב וסגנו, והבנת מנהלי האזורים	עמידה בתכנית העבודה
הקצאת זמן ומשאבים לפרויקטים בלתי צפויים – כחלק מתכנית העבודה	בלת"מים
עבודה אינטנסיבית בשנים קודמות יצרה כ- 30 פרויקטים מוכנים לביצוע. מאפשר להתרכז בתכניות אב ורעיוניות	בנק פרויקטים מוכנים
אנשי צוות מיומנים ומוכשרים במחלקה – תכנון יעיל, זול, מהיר ומותאם לשטח. יחידת ביצוע מקצועית המבינה את העבודה	יכולת תכנון וביצוע עצמי
שיתופי פעולה בתהליכי התכנון והעבודה בכלל עם מנהלי האזורים, רכזי קליטת קהל, מחלקת יער, מחלקת הנדסה ויחידת הביצוע.	שת"פ
חלוקה תקציבית טובה הכוללת גם פול תקציבי שאיפשר עבודה רציפה.	חלוקה תקציבית
גב מקצועי, קידום מסמכי מדיניות ותכניות אב ארציות שמהוות בסיס להמשך תכנון.	אגף התכנון

סיורים



חיים



עדי



ענת



יאוב




כמעט כולם...



טליה



ברט

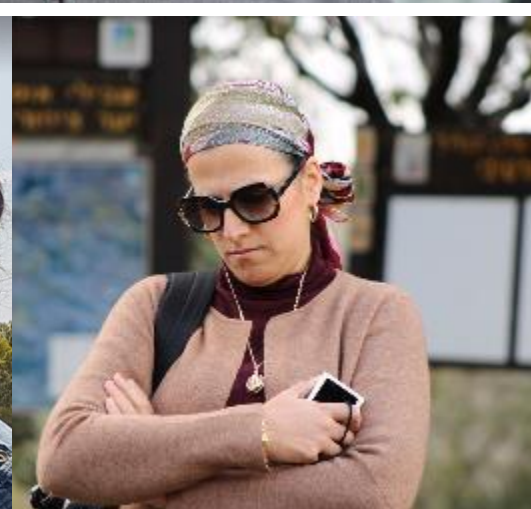

אורלי

סיור מחלקות ואגף התכנון לצפון דצמבר 2018

עם הפנים ל 2019

משימה	תקציב	תיאור תפוקה	סה"כ תכנון שנתי	הערות
הכנת תכניות אב ליערות ופארקים בניהול קק"ל	250	קידום 2 תכניות אב ליערות	יער ירושלים נחל תנינים	
כתיבת מסמכי מדיניות	200	קידום 2 מסמכי מדיניות לתכנון ביערות	שני מסמכי מדיניות	מיתוג ושילוט מוקדי שרות, פרק שימור נגר בתכניות אב
תכניות פיתוח במקרקעי ייעור	520	קידום שדרוג שיקום הנגשה ופיתוח כ- 30 אתרים קולטי קהל ביערות	השלמת 15 תיקי תכנון מוכנים לביצוע	קידום 4 תכניות רעיוניות, 7 יערות קהילתיים, 5 חניוני לילה, 2 מרכזי הוקרה, 12 תכניות שדרוג חניונים. חלק יתוקצב מאגף התכנון
תכניות אופניים במקרקעי ייעור	520	קידום 4 תכניות מפורטות לשבילי אופניים במרחב	ביצוע שביל 2, תיק מרכז 1, תכנון מפורט 1	תקציב אגף התכנון. צרעה ואשתאול, יערות מצר מענית, עין רפא. שפלת יהודה
תכניות בינוי	550	קידום תכנון 5 מוקדי שרות יערניים במרחב	היתר לסטף, ביצוע יד קנדי, פרוגרמה למוקדי בן שמן, תכנון רעיוני לבית הרצל	
תכניות מפורטות מתמשכות (סטטוטוריקה)	400	אישור תכניות יער מפורטות	טיוטת תכנית ראש העין ואישור להפקדת תכנית יער מודיעין	

עבודת צוות אינטנסיבית – עם הפנים ל 2019



כולם ברמת הנדיב- סדנא
רישום: בלה נודלמן



טליה



ענת



חיים

חנניה

אורלי

מצפים לעוד שנה פוריה!



ברט



חנניה



ענבל



עדי



בלה
